Лабораторная работа №1 Методологии управления ИТ-проектами

Цель: знакомство с методологиями управления ИТ-проектами.

Теоретические вопросы

В настоящее время управление проектами имеет свою методологию и основывается на определенных стандартах. В основе таких методов лежат методики сетевого планирования, которые появились США в конце 1950-х гг. При этом методики управления проектами широко распространились не только в странах с рыночной экономикой, но и в странах с т. н. «плановой» экономикой. Они начали использоваться в строительстве, что послужило основой их распространения в других отраслях и появлению методов проектного управления.

Примером здесь может служить объединение усилий фирмы «Дюпон» и фирмы «Ремингтон Рэнд» для составления плана графика комплексных работ по модернизации заводов «Дюпон» с помощью вычислительной машины Univac в 1956 г. Результатом стало создание рационального и простого метода описания проекта на ЭВМ – метода критического пути (СРМ – Critical Path Method).

Практически параллельно и независимо был создан метод анализа и оценки программ PERT (Program Evaluation and Review Technique) в военноморских силах США. Данный метод разрабатывался корпорацией «Локхид» и консалтинговой фирмой «Буз, Аллен энд Гамильтон» для ракетной системы «Поларис». Проект включал 3800 основных подрядчиков и состоял из 60 000 операций. Благодаря использованию данного метода проект стал успешным и завершился на два года раньше срока. После наглядного успеха метод PERT стал использоваться в вооруженных силах США для планирования проектов.

Задание: найдите примеры других крупных успешных проектов прошлого века, использующих для своего управления ЭВМ.

Учтите, что с одной стороны, применение информационных технологий для планирования и управления проектами давало в те времена значительное преимущество, а с другой стороны, первые компьютеры были дорогостоящими и оставались доступными только крупным компаниям. Все

изменилось с появлением персональных компьютеров, теперь ЭВМ стала рабочим инструментом для руководителей более широкого круга.

Система управления проектами постоянно развивалась и стала самостоятельной областью профессиональной деятельности. В итоге были созданы унифицированные методологии, инструментарии, механизмы, стандарты, доступные и для проектов в ИТ-сфере. Например, на сегодняшний день существует единая Международная ассоциация управления проектами — IPMA (International Project Management Association) с центром в г. Цюрих (Швейцария).

Из наиболее распространенных можно отметить процессную модель, используемую в документах методологических основ управления проектами – Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Американского института управления проектами (PMI). Данный документ признается международным стандартом де-факто. Кроме того, стандарт ISO 10006:1997 придал ряду наиболее важных положений PMBOK статус стандарта де-юре.

В 2014 г. вышло пятое издание РМВОК, содержащее указания на 589 страницах. Все положения представлены на сайте http://www.pmi.org/default.aspx.

Данные Международной ассоциации управления проектами (IPMA) говорят о том, что использование современных методологий управления проектами экономит около 20–30% времени и около 15–20% средств на осуществление проектов.

Все методологии (еще их называют моделями, методиками) разработки программного обеспечения классифицируют по «весу», т. е. по количеству формализованных процессов и детальности их регламентации. Следовательно, чем больше процессов документировано, чем более детально описана методология, тем больше будет ее «вес».

- 1. Тяжеловесные методологии:
- ГОСТ 19 «Единая система программной документации» и ГОСТ 34 «Стандарты на разработку и сопровождение автоматизированных систем» ориентированы на последовательный подход к разработке программного обеспечения;
- Capability Maturity Model for Software (SW-CMM) определяет пять уровней «зрелости проекта»;

- Rational Unified Process (RUP) итеративная модель разработки;
- Microsoft Solutions Framework (MSF) база знаний компании Microsoft по разработки программ;
- Personal Software Process модель определяет требования к компетенциям разработчика. Team Software Process модель ориентирует на самоуправляемые команды от 3 до 20 разработчиков.
 - и др.
 - 2. Легковесные или agile-методики:
- eXtreme Programming или XP экстремальное программирование, предлагающее 12 инженерных практик;
- Crystal Clear семейство методологий, определяют необходимую степень формализации процесса разработки в зависимости от количества участников и критичности задач [13];
- Feature Driven Development (FDD) функционально- ориентированная разработка;
- ОрепUP итеративно-инкрементальный метод разработки программ,
 позиционируется как легкий и гибкий вариант тяжеловесной методологии
 RUP;
- Scrum управление разработкой информационных систем с высокой степенью неопределенности;
 - Kanban методология «бережливого производства»;
 - и др.

Результаты исследования Agile Survey о популярности гибких методологий представлены на рисунок 1.




Рисунок 1 - Популярность гибких методологий

Легковесные методологии Agile появились сравнительно недавно. В феврале 2001 г. 17 специалистов (консультантов и практиков) провели семинар, на котором сформулировали основные принципы гибкой разработки ПО – Agile Manifesto – манифест гибкой разработки. Он переведен на многие языки мира и доступен на сайте https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html.

Идея всех гибких (легковесных) методологий состоит в том, что применяемый в разработке ПО процесс должен быть адаптивным, ориентированным на людей и их взаимодействие. По сути это скорее набор практик, чем методология.

На том же семинаре было предложено новое название таких методологий – гибкая разработка Agile Software Development.

При выборе модели управления проектом можно ориентироваться на следующую таблицу (таблица 2).

Таблица 2 – Выбор методологии управления проектом

Вес модели	Достоинства	Недостатки		
Тяжеловесные	- процессы рассчитаны насреднюю	– требуют существенной		
	квалификацию	– длительные стадии анализа		
	исполнителей;			
	 большая специализация 			
	исполнителей;	формализованные коммуникации.		
	– низкие требования к стабильности			
	команды;			
	– отсутствуют ограничения по			
	объему и сложности выполняемых			
	проектов.			
Легковесные	– снижение	 эффективность сильно 		
(гибкие)	непроизводительных расходов,	зависит от индивидуальных		
	связанных с управлением	способностей, требуют более		
	проектом, рисками, изменениями,	квалифицированной,		
	конфигурациями;	универсальной и стабильной		
	 упрощение стадий анализа и 	команды;		
	проектирования, основной упор на	– объем и		
	разработку функциональности,	сложностьвыполняемых		
	совмещение ролей;	проектов ограничены.		
	 неформальные коммуникации. 			

А. Коуберн, один из авторов «Манифеста», провел анализ ИТ-проектов за последние 20 лет [4], выполненных на основании разных моделей управления: от облегченных, гибких до тяжелых (СММ-5). Данный анализ показал отсутствие корреляции между успехом или провалом проектов и выбранными моделями разработки, применяемыми в проектах.

А. Коуберн сделал также вывод о том, что:

- 1. У каждого проекта должна быть своя модель процесса разработки.
- 2. У каждой модели свое время.

Для разработчиков это означает, что не существует единственного правильного процесса разработки. В каждом новом проекте процесс должен определяться каждый раз заново по «закону четырех П» (рисунок 2).

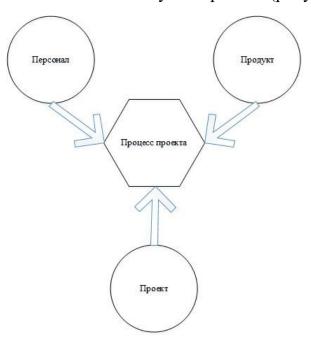


Рисунок 2 - Закон четырех П

Ход работы

Задание 1. С помощью поиска в сети Интернет найдите информацию о современных методологиях управления ИТ-проектами. Представьтеоснования для их классификации. Для каждого основания приведите примеры методологий.

Задание 2. Из полученного списка тяжеловесных методологий управления ИТ-проектами выберите один. Проведите исследование методологии. Результат представьте в таблице (таблица 3).

Таблица 3 – Особенности методики

Характеристика	Описание				
Полное название методологии					
Авторы					
История возникновения					
Страна появления					
Основные принципы, подходы					
Имеются ли программные средства					
реализации методологии, какие?					
Используется ли в настоящее время					
Примеры успешных проектов,					
реализованных с помощью данной					
методологии					

Задание 3. Из полученного списка легковесных (agile) методологий управления ИТ-проектами выберите один. Проведите исследование методологии. Результат представьте в таблице (таблица 3).

Задание 4. Выберите любую из проанализированных методологий. Создайте о ней презентацию на 10-15 слайдов. Выступите в группе, будьте готовы ответить на вопросы.

Контрольные вопросы:

- 1. Что такое методология управления ИТ-проектом?
- 2. Какие виды методологий вы знаете?
- 3. В чем особенности тяжеловесных и легковесных методологийуправления?
- 4. Приведите примеры методологий, используемых для разработкиИТ-проект
